


PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO



PROGETTO ESECUTIVO

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAVO DIOTTI IN COMUNE DI MERONE (CO)

DICEMBRE 2011

UN DIRETTORE TECNICO
Dott. Ing. GIOVANNI BATTISTA PEDUZZI
FIRMA DEL PROGETTISTA
Dott. Ing. GIOVANNI BATTISTA PEDUZZI
CALCOLI IDRAULICI
Dott. Ing. NOEMI MARIA COLOMBO

	NOME	FIRMA	DATA
REDAZIONE	N.M. Colombo		
VERIFICA	G.B. Peduzzi		
APPROVAZIONE	G.B. Peduzzi		



20133 MILANO - via Bassini, 23 - tel.(02) 26681264
fax (02) 26681553 - E-Mail: etatec@etatec.it

TITOLO

CRONOPROGRAMMA

Revisioni	N°	Descrizione	Data
	1	AGGIORNAMENTO	LUGLIO 2012
	2		
	3		
Numero elaborato	TIPOLOGIA PE	COMMESSA 365/02	DOCUMENTO ED
			NUMERO A.09.00

CRONOPROGRAMMA

"Opere di ristrutturazione del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"

N°fase	Giorno inizio fase	Durata fase	Giorno fine fase
ALLESTIMENTO CANTIERE	0	7	7
PISTA D'ACCESSO AL CAVO DIOTTI E AL CANALE DI MONTE	7	7	14
REALIZZAZIONE TURA ALL'ORIGINE DEL CANALE DI DERIVAZIONE	14	5	19
REALIZZAZIONE TURA A MONTE DELLA CASA DI GUARDIA	19	5	24
REALIZZAZIONE DELLA TURA A VALLE DELLA GALLERIA	24	5	29
SMANTELLAMENTO DELLE OPERE DI REGOLAZIONE	29	10	39
AMPLIAMENTO LUCI	25	15	40
PARZIALE DEMOLIZIONE DELLA STRUTTURA A MONTE DELLA CASA E RELATIVI SCAVI	35	15	50
COSTRUZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA A MONTE DELLA CASA DI GUARDIA	50	30	80
DRAGAGGIO DEL CANALE DI DERIVAZIONE	30	60	90
PARZIALE DEMOLIZIONE DELLA PLATEA DELLA VASCA DELLE ANGUILLE, DEI MURI LATERALI ALLA SEZIONE DI IMBOCCO E RELATIVI SCAVI	60	5	65
POSA DEL SELCIATONE SUL FONDO DEL TOMBOTTO	65	35	100
RIVESTIMENTO DEL TOMBOTTO COME DA PRESCRIZIONE	100	15	115
RISAGOMATURA DEL TERRENO A MONTE DELLA VASCA DELLE ANGUILLE CON MURI DI SOSTEGNO	115	30	145
RICOSTRUZIONE DELLA PLATEA CON GARGAME, DEI MURI-GUIDA, DEL SALTO NELLA VASCA DELLE ANGUILLE.	145	25	170
POSA DELLE PARATOIE	170	10	180
POSA DELL'ALLOGGIAMENTO DELL'IMPIANTO DI GESTIONE DELLE PARATOIE CON I QUADRI ELETTRICI	180	5	185
POSA DEL CAVIDOTTO LUNGO VIA B. CROCE E DEGLI STRUMENTI DI MISURA	185	25	210
POSA DELLO SGRIGLIATORE A MONTE DELLA CASA DI GUARDIA	185	10	195
COLLEGAMENTO DELLE PARTI MECCANICHE ALL'ALLOGGIAMENTO DELL'IMPIANTO DI GESTIONE	195	5	200
SPOSTAMENTO DELLA TURA DI VALLE	200	4	204
CORAZZAMENTO DEL FONDO IN CORRISPONDENZA DELLO SBOCCO DEL TOMBOTTO E DELLA SPONDA SINISTRA	204	25	229
RIMOZIONE DELLA TURA DI VALLE (LOC. STALLO)	229	4	233
RIMOZIONE DELLE TURE DI MONTE (CASA DI GUARDIA)	233	4	237
REALIZZAZIONE TURA IN LOC. STALLO (PARTE NON CORAZZATA)	237	4	241
CORAZZAMENTO DEL FONDO IN CORRISPONDENZA DELLA SPONDA DESTRA IN LOC. STALLO	241	30	271
CORAZZAMENTO DELLA SPONDA SINISTRA	271	15	286
RIMOZIONE DELLA TURA	286	4	290
SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE	290	10	300
TOTALE GIORNI		300	


N.B. : nel cronoprogramma sono da considerare 2 ÷ 5 interruzioni delle lavorazioni per motivi di sicurezza legate ai livelli del lago di Pusiano.
I giorni di interruzione saranno concessi in forma di proroga automatica a fine lavori.

Milano, luglio 2012

Il progettista
Dott. Ing. Giovanni Battista Peduzzi

Ha collaborato
Dott. Ing. Noemi Maria Colombo

CRONOPROGRAMMA
"Opere di ristrutturazione del Cavo Diotti in Comune di Merone (CO)"

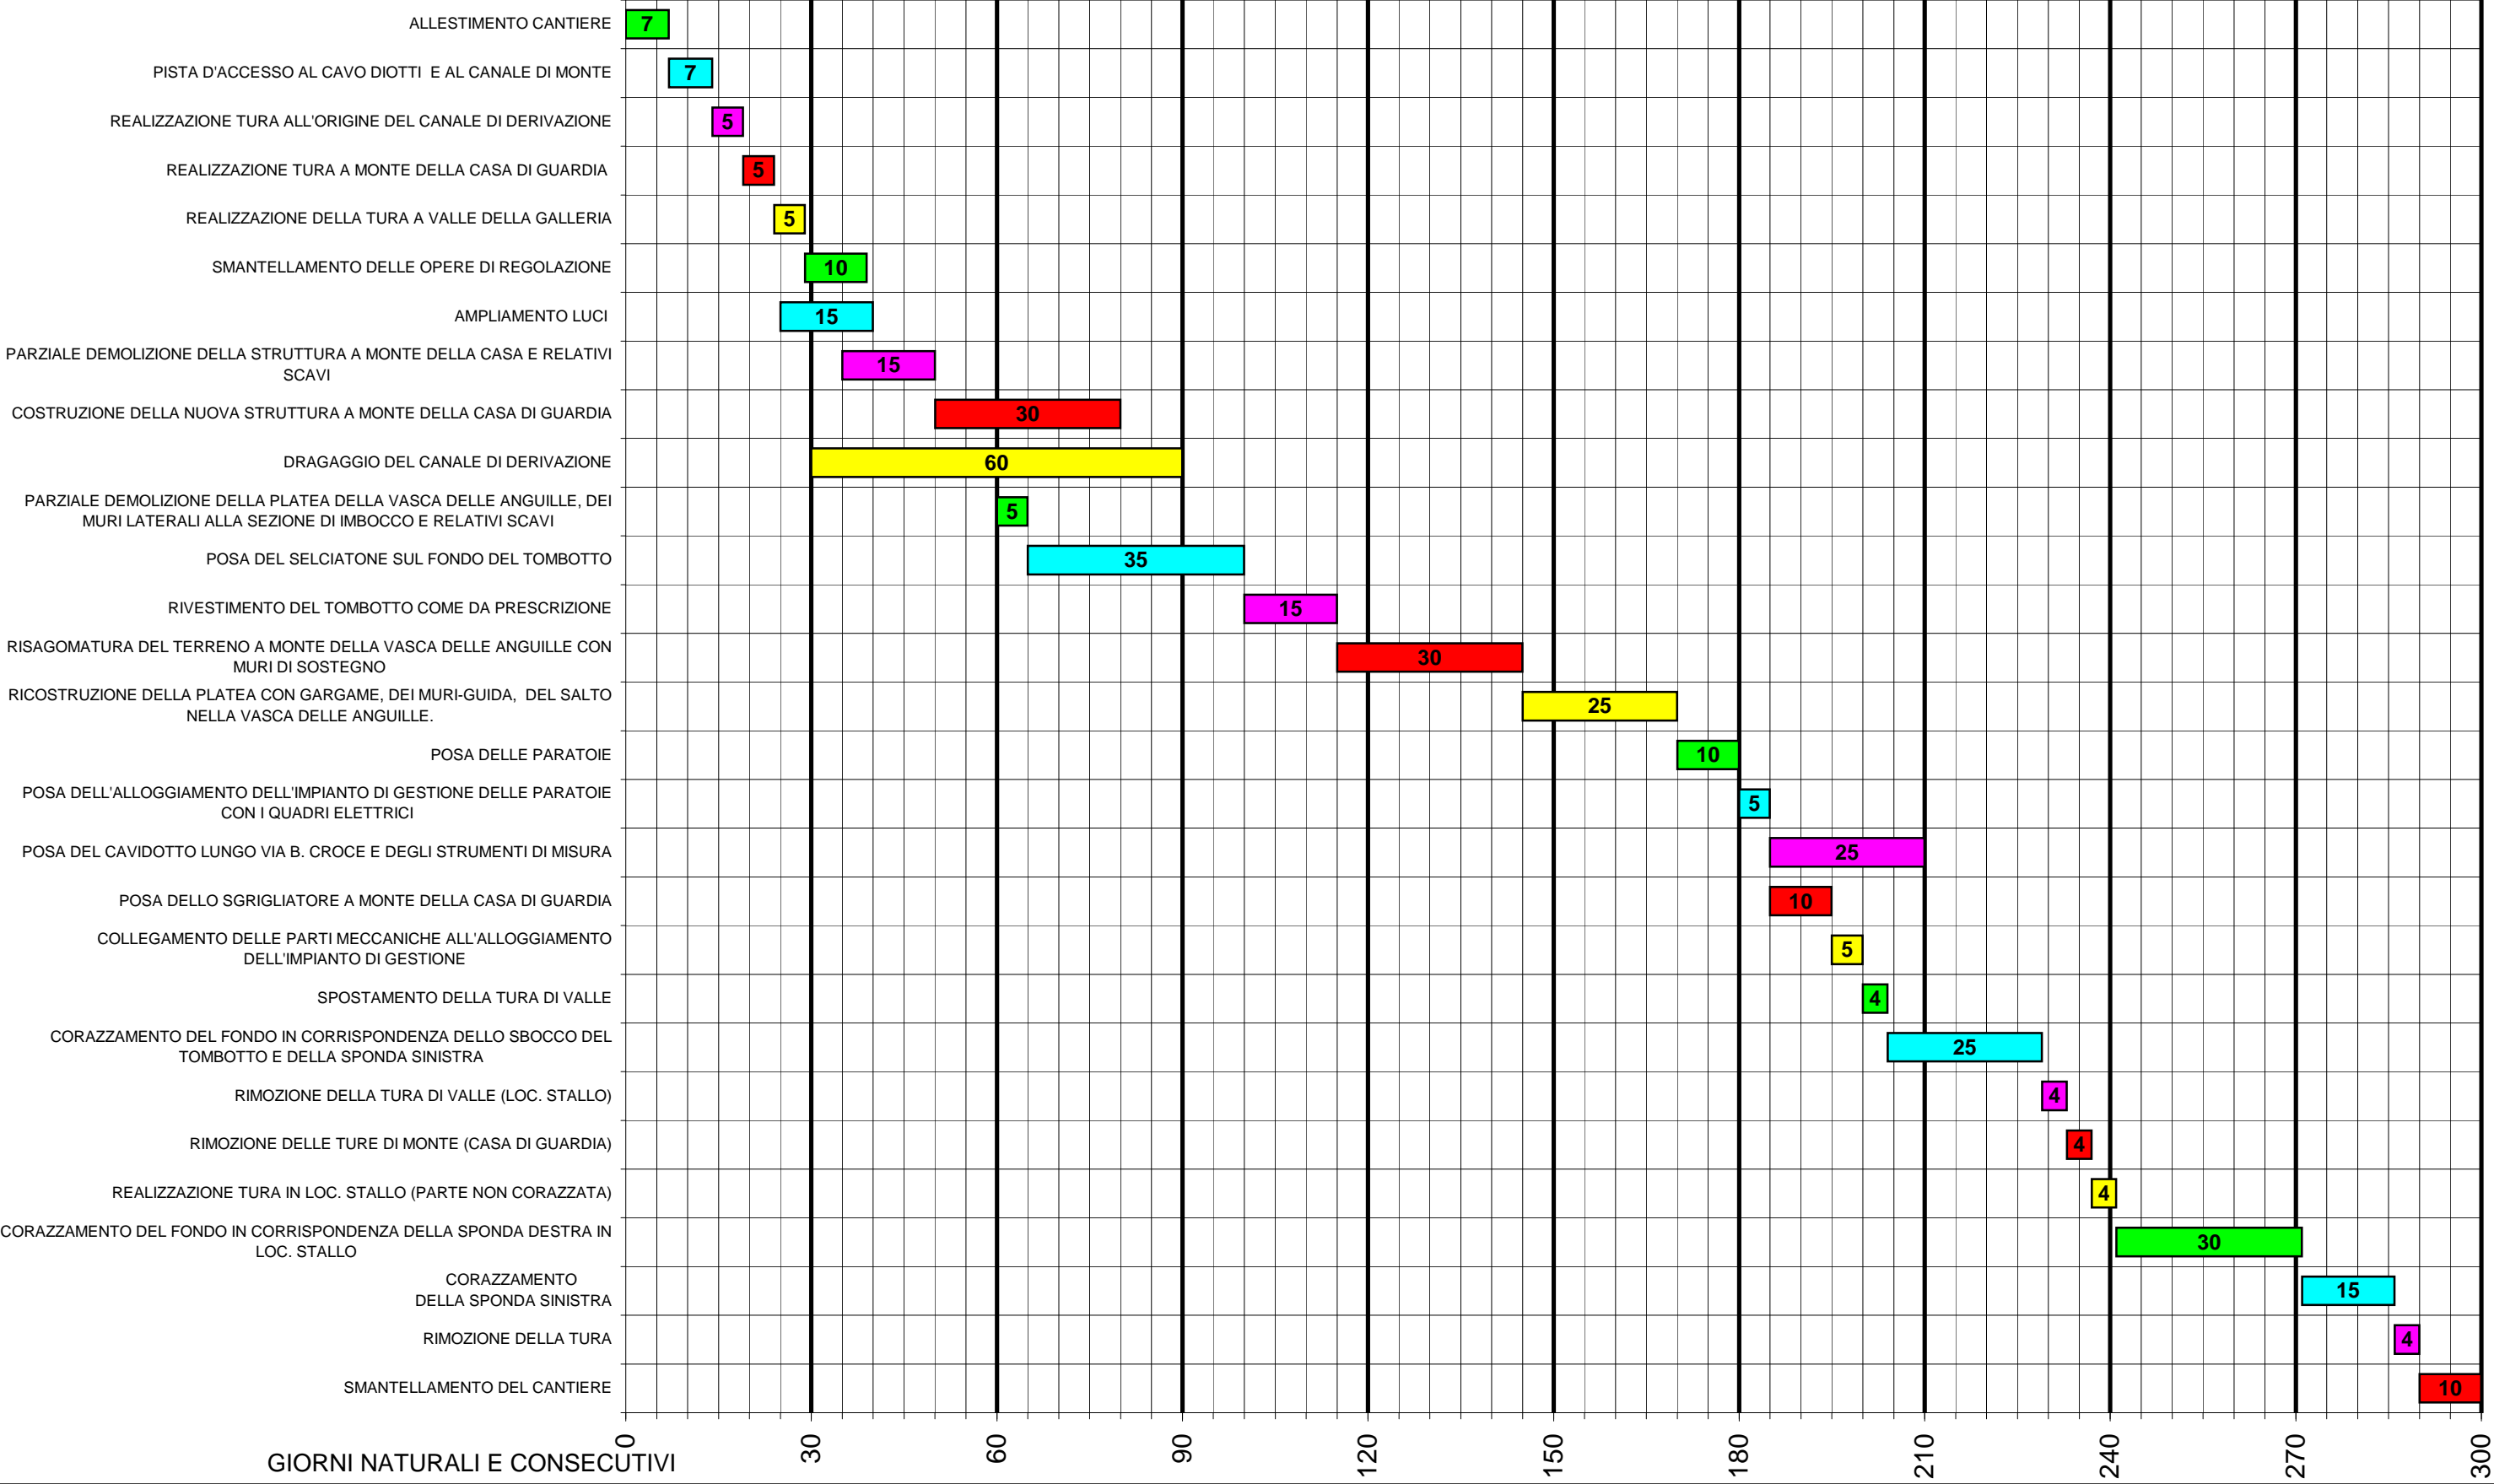

N.B.: nel cronoprogramma sono da considerare 2 ÷ 5 interruzioni delle lavorazioni per motivi di sicurezza legati ai livelli del lago di Pusiano.
I giorni di interruzione saranno concessi in forma di proroga automatica a fine lavori.
